

Intentieovereenkomst Zoetwatervoorziening Reimerswaal

tussen

Provincie Zeeland,
Waterschap Scheldestromen,
Gemeente Reimerswaal,
Zeeuwse Milieufederatie en
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie



Waterschap Scheldestromen



Gemeente
REIMERSWAAL



DEZE INTENTIEOVEREENKOMST (de **Intentieovereenkomst**) is aangegaan

TUSSEN

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon **PROVINCIE ZEELAND**, gevestigd te Middelburg; rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gedeputeerde A.R.M. Vael, daartoe gevolmachtigd door de Commissaris van de Koning H.M. de Jonge, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. , met kenmerk , hierna aangeduid als "de Provincie Zeeland";
2. De publiekrechtelijke rechtspersoon **WATERSCHAP SCHELDESTROMEN**, gevestigd te Middelburg; rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dagelijks Bestuurslid W. van Gorsel, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen d.d. , met kenmerk , hierna aangeduid als "het waterschap Scheldestromen";
3. De publiekrechtelijke rechtspersoon **GEMEENTE REIMERSWAAL**, gevestigd te Kruiningen; rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder M. van Overloop, daartoe gevolmachtigd door waarnemend burgemeester J.J. Luteijn, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. , met kenmerk , Hierna aangeduid als "de gemeente Reimerswaal";
4. Vereniging **Zeeuwse Milieufederatie**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Middelburg aan Kousteensedijk 7, in deze vertegenwoordigd door directeur Ira von Harras, hierna te noemen "ZMf";
5. **Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18054307, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te Colijnsplaat aan de Noordlangeweg 42-B, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer W.T.G. Bens, en haar bestuurder, de heer H.J.P. ten Cate, hierna te noemen: 'ZLTO'.

Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk "Partij"

OVERWEGENDE DAT

A. door toenemende droogteproblematiek als gevolg van klimaatverandering de beschikbaarheid van zoetwater voor de landbouw in de gemeente Reimerswaal (hierna: Reimerswaal) tekortschiet en dit een negatief effect heeft op de agrarische sector.

B. In 2022 een haalbaarheidsonderzoek door Witteveen + Bos is uitgevoerd waaruit bleek dat er mogelijkheden zijn om een deel van het afstromende water uit het Bathse Spuikanaal, dat nu via de Bathse Spuisluis de Westerschelde instroomt, in te zetten ten behoeve van een zoetwatervoorziening in Reimerswaal, in het gebied zoals weergegeven in bijlage 1, waarbij de investeringskosten in 2022 op €40.000.000,- werden geraamd.

C. Provincie Zeeland het Rijk, in het kader van de brede maatschappelijk opgave, onder het Nationaal Programma Landelijk Gebied, heeft verzocht om financiële middelen om tot uitvoering te komen van een aantal koplopersmaatregelen, waaronder de zoetwatervoorziening voor Reimerswaal.

D. Partijen onderzoeken of de verbetering van de zoetwatervoorziening is te koppelen aan kansen in het kader van de verbetering van de leefbaarheid in Reimerswaal.

E. Het Rijk een positieve grondhouding heeft ten aanzien van het onderzoek en de planuitwerking van dit project.

F. Het Rijk hierbij heeft aangegeven dat het onderdeel groenblauwe dooradering (GBDA) integraal onderdeel dient te zijn van het project om bij te dragen aan de versterking van natuur en verbetering van de waterkwaliteit in het gebied, waardoor verdere planvorming hiertoe wenselijk is.

G. Het Rijk voor verdere uitvoering van het onderzoek voor planvoering een financiële rijksbijdrage van € 252.000,- aan de Provincie Zeeland ter beschikking heeft gesteld.

H. Het Rijk actief ambtelijk participeert in deze verkenning.

I. De door de Tweede Kamer aangenomen motie van 20 juni 2024, Nr. 382, van het Tweede Kamerlid Van Campen oproept tot de aanpak van verzilting en de schaarste aan zoetwater in kustprovincies, zoals Zeeland.

J. De zoetwatervoorziening Reimerswaal tevens deel uitmaakt van het nog in te dienen maatregelenpakket Zuidwestelijke Delta voor de 3^e tranche Deltaprogramma Zoetwater (2028-2034).

K. Provincie Zeeland in dit licht met het Rijk in gesprek is, om bij te dragen aan een investering, om de uitvoer van de zoetwatervoorziening voor Reimerswaal mogelijk te maken.

L. De Kaderrichtlijn Water-opgave voor het gebied zich richt op het verbeteren van de waterkwaliteit en binnen het project kansen biedt om deze invulling te versterken.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

1 DOEL VAN DEZE INTENTIEOVEREENKOMST

- Het doel van deze samenwerking is zoveel als mogelijk voorzien in de structurele beschikbaarheid van zoetwater ter ondersteuning van de landbouw en leefbaarheid in Reimerswaal.
- Om hiertoe te komen worden de volgende uitgangspunten vastgesteld:
 - Partijen werken samen met de intentie om te komen tot duurzame maatregelen die bijdragen aan een langetermijnverbetering van de leefomgeving voor mens en dier, de natuur, de potentiële economie, duurzame sociaal-maatschappelijke structuur en ontwikkeling van Reimerswaal. Zij zijn van mening dat door samenwerking de belangen van betrokken partijen optimaal kunnen worden gediend en willen maatregelen treffen die bijdragen aan deze duurzame langetermijnverbetering.
 - Partijen onderkennen dat hiertoe nader onderzoek nodig is m.b.t. de technische haalbaarheid, financiering, draagvlak en beheer, alsook bredere maatschappelijke opgaven, zoals GBDA en KRW.
 - Door deze intentieovereenkomst wordt het bestuurlijk overleg tussen Partijen om deze verkenning vorm te geven geformaliseerd.
 - Dit bestuurlijk overleg wordt bijgestaan door een ambtelijke projectgroep, die een projectplan heeft vastgesteld, dat onderdeel uitmaakt van deze intentieovereenkomst.
 - Partijen bekrachtigen met deze intentieovereenkomst zowel de bestuurlijke samenwerking als het bijgevoegde projectplan.
 - Partijen zijn, op basis van de resultaten van nader haalbaarheidsonderzoek, voornemens een verdere interbestuurlijke samenwerking aan te gaan om het 'project Zoetwatervoorziening Reimerswaal', daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.
 - De intentieovereenkomst en het bijbehorende projectplan bevatten kaders waarbinnen de haalbaarheid wordt onderzocht.

- Deze kaders geven richting om, bij voldoende haalbaarheid en bestuurlijk draagvlak, tot een samenwerkingsovereenkomst te komen, zodat tijdig tot uitvoering kan worden overgegaan.

2. DUUR EN TERMIJN

Deze Intentieovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en heeft een looptijd tot 31 december 2026. Binnen deze termijn streven partijen ernaar een uitspraak te doen of uitvoering definitief haalbaar is en, indien haalbaar, om een definitieve samenwerkingsovereenkomst op te stellen en te sluiten. Mocht de haalbaarheid niet voor 31 december 2026 kunnen worden vastgesteld, dan zal de overeenkomst stilzwijgend met één jaar worden verlengd.

3. HAALBAARHEID UITVOERING

- 3.1 Partijen verrichten nader onderzoek naar de haalbaarheid, op minimaal de volgende punten:
- Technische haalbaarheid
 - Uitwerking van de mogelijkheden voor inpassing van Groen Blauwe dooradering (GBDA)
 - Draagvlak onder de agrariërs in de streek als gevolg van meerkosten en grondbehoefte t.b.v. de uitvoering
 - Ecologische effecten en de hierbij behorende wettelijke mogelijkheden vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW)
 - Investeringsmogelijkheden
 - Mogelijkheden tot realisatie van overige koppelkansen
 - Mogelijkheden tot realisatie van quickwins
- 3.2 Voor te leggen besluitvorming over de finale doorgang van de uitvoering van het project wordt voorbereid in de ambtelijke projectgroep.
- 3.3 Partijen dienen zelf tot besluitvorming over te gaan in hun besturen.

4 TREKKERSCHAP, VERANTWOORDELIJKHEDEN

- 4.1 Ondertekenende Partijen vormen tezamen een bestuurlijke stuurgroep. Partijen vaardigen hiervoor één vertegenwoordiger af vanuit de eigen organisatie. Deze stuurgroep komt driemaandelijks bijeen. Hierin wordt nader invulling gegeven aan het bepalen van de haalbaarheidskaders, vervolgonderzoek, alsmede voortgangsbewaking. Deelnemers rapporteren zelf aan hun besturen over de voortgang.
- 4.2 De stuurgroep wordt voorgezeten door de Provincie Zeeland.
- 4.3 Partijen nemen gezamenlijk deel aan een ambtelijke projectgroep, die wordt voorgezeten door Provincie Zeeland. In de ambtelijke projectgroep wordt de voortgang van deelprojecten, alsook de samenhang, besproken. De ambtelijke projectgroep bereid de stuurgroep voor en zorgt voor de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst.
- 4.4 Provincie Zeeland treedt ambtelijk op als overall projectleider/verkenner. Deelnemers aan de projectgroep kunnen als projectleider voor deelonderwerpen optreden.
- 4.5 Partijen stellen uren beschikbaar conform bijgevoegd projectplan.
- 4.6 Partijen committeren zich aan een constructieve en transparante samenwerking en het delen van relevante informatie.
- 4.7 Partijen werken actief en constructief samen om (vergunnings)procedures goed te doorlopen.

5. FINANCIERING

- 5.1 De verkenning wordt bekostigd door de Provincie Zeeland uit de door het Rijk beschikbaar gestelde rijksbijdrage van € 252.000,- , zoals vermeld in 'Overwegende dat'.
- 5.2 Indien de verkenningkosten de som van de Rijksbijdrage overschrijden, treden overheidspartijen in overleg over het delen van de overige kosten.
- 5.3 Indien definitief tot uitvoering wordt overgegaan, dienen overheidspartijen in een samenwerkingsovereenkomst nadere afspraken te maken over de verdeling van de investeringslasten. De bij deze verkenning betrokken overheden spreken de intentie uit om een nader te bepalen bijdrage te doen om het project tot stand te kunnen brengen.

6. SAMENWERKING EN UITVOERING

- 6.1 De volgende punten maken integraal onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek:
- Bepalen en vastleggen van projectuitvoerende partij(en) en bijbehorende governancestructuur;
 - Verdeling en invulling van de investeringskosten, alsmede onderhoud- en beheerkosten.
 - Nadere afspraken over het dragen van de risico's, zowel m.b.t. investeringsfinanciën, juridische aspecten als uitvoeringsaspecten.
 - Nadere afspraken over planvorming, planuitwerking, aanbesteding, realisatie, en beheer en onderhoud.
- 6.2 Onder voorbehoud van een positief oordeel rondom de haalbaarheid en bij voldoende bestuurlijk draagvlak, zullen de punten genoemd onder 6.1 door partijen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

7. PLANNING

Ten tijde van de vaststelling van deze Intentieovereenkomst, wordt uitgegaan van de planning conform bijgevoegd projectplan.

8. VERTROUWELIJKHEID

Partijen verplichten zich, tijdens de looptijd van deze Intentieovereenkomst, maar ook daarna, tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die in het kader van de samenwerking wordt uitgewisseld, behoudens wettelijke verplichtingen.

9. TOEPASSELIJK RECHT

- 9.1 Geschillen zullen door de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden beslecht, maar pas nadat partijen in onderling overleg niet tot een minnelijke oplossing zijn gekomen.
- 9.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10. INWERKINGTREDING

Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat alle partijen deze overeenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend.

Aldus opgemaakt in vijfvoud, ondertekend op datum 26-11-2025,

Provincie Zeeland

Gemeente Reimerswaal

de heer A.R.M. Vael
Gedeputeerde

de heer M. van Overloop
Wethouder

Waterschap Scheldestromen

Zeeuwse Milieufederatie

de heer W. van Gorsel
Dagelijks bestuurder

mevrouw I. von Harras
Directeur

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Bestuurder

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Voorzitter


de heer H.J. ten Cate

de heer W.T.G. Bens

Bijlage A Gebied


Legenda:

Het gebied is als volgt afgebakend. Lila (Zoetwatervoorziening B) is beoogd ontwerp-/voorzieningsgebied, dit is nieuw voorzieningsgebied. Geel en groen (Reigersbergsche polder) zijn reeds voorzien van zoet water.

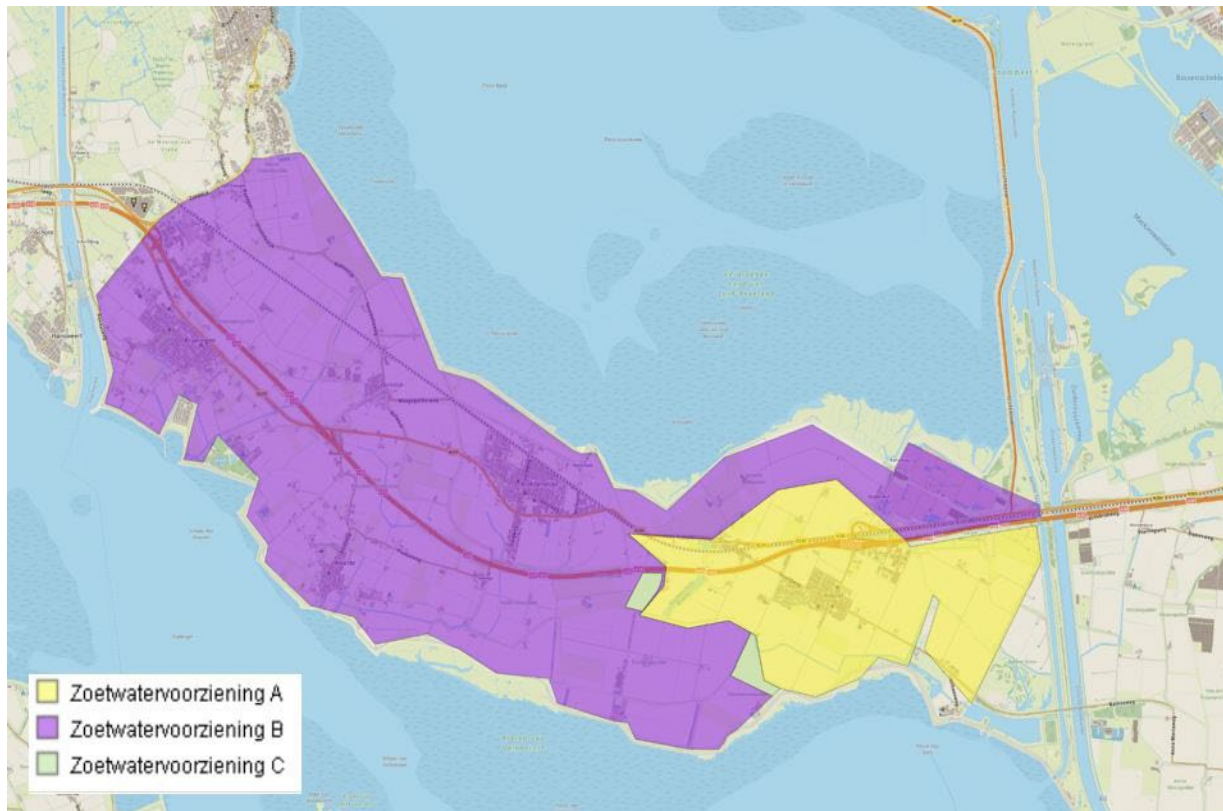

- Vertrekpunt voor nadere uitwerking en afbakening is het Schetsontwerp van Witteveen + Bos van 13 juli 2022.
- Het huidige aanvoersysteem van de Reigersbergsche Polder blijft zoals het nu is. Er gelden thans twee differentiatietarieven voor dit gebied. Voor Zoetwatervoorziening A geldt een Tariefdifferentiatie van 45%, voor Zoetwatervoorziening C geldt een Tariefdifferentiatie van 35%.
- Het Schetsontwerp van Witteveen + Bos van 13 juli 2022 ziet toe op nadere uitwerking in twee gebieden:
 - o Een nieuwe inlaat maken aan de noordkant van de spoorlijn en rijksweg om onder vrij verval water in te laten vanuit het Bathse Spuikanaal.
 - o Uitbreiden gemaal Rilland om het bestaande aanvoergebied en de Zimmermann- en Fredericapolder te voorzien van zoet water. Dit wordt tevens betrokken in de uitwerking van de quick wins.

- Er kunnen tussen beiden gebieden relaties zijn in de uitwerking.
- De Yerseke Moer is uitgezonderd als voorzieningsgebied, omdat een groot deel van dit bemalingsgebied (brakke) natuur is. Daarnaast is er veel (1,9 m³/s) water nodig om tot aan gemaal De Moer het gebied zoet te spoelen.
- Het bedrijventerrein 'de Kreeft' bij Yerseke is uitgesloten.
- Het gedeelte van de Yerseke Moer dat aan de grens ligt met afvoergebied Glerum kan vanaf de Zanddijk via buizen en haspels wel nog zoet water ontvangen. Het dekingsgebied is hieronder weergegeven.

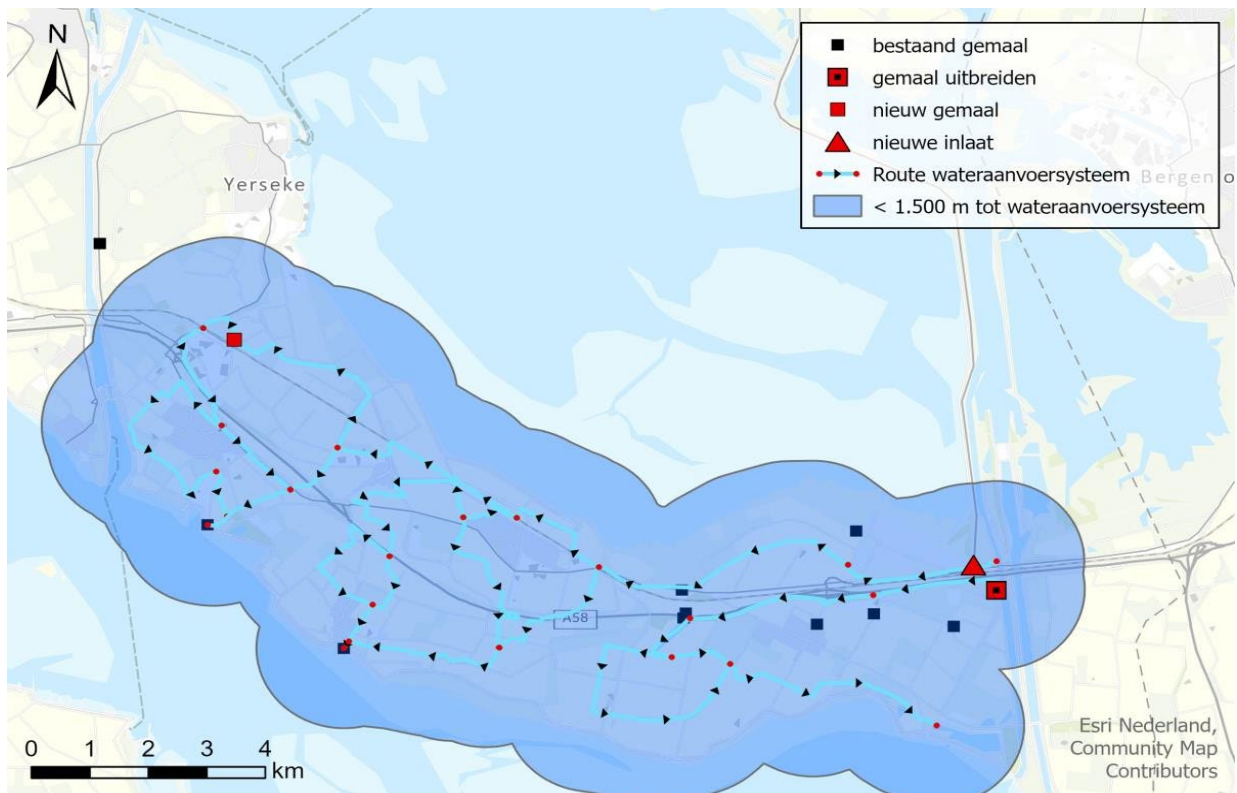

Bijlage B Projectplan

PROJECTPLAN



Project : Zoetwatervoorziening Reimerswaal
 Projectnummer : Nummer invullen (indien bekend)
 Bestuurlijk opdrachtgever : Arno Vael
 Ambtelijk opdrachtgever : [Redacted] m.m.v. [Redacted]
 Projectleider : [Redacted]
 Budgethouder : [Redacted]
 Activiteitsnummer Coda : n.v.t.
 Programma : Programmabureau Uitvoering
 Projectperiode : Aanvang: januari 2025
 Afronding: december 2026
 Vastgesteld op :

Paraaf : Paraaf ambt. Opdrachtgever en projectleider invullen

I. PROJECTBESCHRIJVING

I.1	Inleiding en Probleemstelling Zoetwateraanvoer naar Zuid-Beveland-Oost is van groot belang voor de agrarische sector. Door toenemende droogteproblematiek als gevolg van klimaatverandering staat de beschikbaarheid van zoet water al langere tijd onder druk. Op 1 juli 2020 is een verzoek gedaan door de ZLTO afdeling Oost Zuid-Beveland aan het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen (verder: Waterschap) en het college van gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland (verder: GS) voor uitbreiding van de zoetwateraanvoer naar Zuid-Beveland-Oost. Naar aanleiding van dit verzoek is door Waterschap Scheldestromen, namens de ZLTO afdeling Oost Zuid-Beveland, opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek en het maken van een schetsontwerp voor een mogelijk wateraanvoersysteem dat, net zoals het bestaande wateraanvoersysteem in de Reigersbergsche Polder aan de oostkant van Zuid-Beveland-Oost, water uit het Bathse Spuikanaal het gebied in brengt. Dit heeft geleid tot een eindverkenning van Witteveen + Bos (3 juli 2022). Waterschap Scheldestromen was opdrachtgever. Er is in het opgeleverde onderzoeksrapport een voorkeursscenario geschetst en er zijn vervolgonderzoeksvragen geformuleerd. Om de werkelijke haalbaarheid van de zoetwatertoevoer te toetsen is vervolgonderzoek op basis van deze en aanvullende vragen nodig. Er is niet één eigenaar van het probleem van de matige zoetwatersituatie in een groot deel van Reimerswaal. Hoewel zoetwater geen kerntaak is van het waterschap, wordt het wel gezien als maatschappelijke opgave waaraan waterschap vanuit de kerntaken wil bijdragen (Gewenste Grond- en OppervlaktewaterRegime - GGOR, inrichten watersysteem om zoet water vast te kunnen houden, werken aan Zeeuws Deltaplan Zoetwater) is externe aanvoer dat niet. Daardoor ontstaat er een investeringsvraagstuk. Daar waar het waterschap wel water van elders aanvoert, belast ze dat door aan eindgebruikers middels apart geheven 'belasting' (retributie).
-----	---

	Er waren tot op heden geen middelen om in het project te investeren. Ook waren er geen nadere (financiële) beheerafspraken gemaakt. Daarom heeft er tot op heden beperkt opvolging plaatsgevonden op het project. Wel is het project in april 2024 ingediend als koplopersmaatregel n.a.v. het NPLG om middelen vanuit het Rijk te krijgen. Het project is toen ingediend vanuit de gedachte dat er koppelkansen zijn met groenblauwe dooradering (verder: GBDA) en het verbeteren van de biodiversiteit. Het Rijk heeft in de integrale beoordeling (december 2024) aangegeven dat er op dat moment geen grond was voor een positief oordeel voor uitvoering van de door de provincie Zeeland voorgestelde investeringen. Tegelijk is aangegeven dat het onderdeel groenblauwe dooradering kansrijk kan zijn voor versterking van natuur en verbetering van de waterkwaliteit in het gebied. Dit vraagt om verdere verkenning en uitwerking. Ook heeft het Rijk een aantal vervolgvragen n.a.v. de indiening gesteld. Dit zijn m.n. vragen op het gebied van de zoetwatervraag, landbouw, vergroening en biodiversiteit. Er is door het Rijk een bedrag van € 250.000,- voor vervolgvragen toegekend, waarbij het Rijk heeft toegezegd betrokken te willen zijn om onder meer inzicht te krijgen in de gestelde vragen (bijlage 2). Op 15 oktober 2024 hebben GS Provincie Zeeland besloten dat zij de verkenner zullen leveren. Hiervoor zijn de volgende besluiten geformuleerd: 1. Instemmen met de verkenning om tot uitvoering te komen van het project Zoetwatervoorziening Reimerswaal. 2. Instemmen met het organiseren van (proces)regie om te komen tot een uitvoerbaar plan, inclusief inventariseren van het actuele draagvlak (o.a. commitment Waterschap en Gemeente Reimerswaal) en het opstellen van een nauwkeurige kostenraming 3. Instemmen met verkennen (Zeeuwse) co-financieringsopties. 4. Uitspreken van de intentie tot cofinanciering als uit het vervolgonderzoek blijkt dat de kosten opwegen tegen de baten en er voldoende draagvlak is voor de uitvoering van dit project. Op 21 november 2024 vond een bestuurlijk overleg plaats tussen Arno Vael (gedeputeerde Provincie Zeeland), Wim van Gorsel (bestuurder Waterschap Scheldestromen), Martien van Overloop (Wethouder gemeente Reimerswaal), Ira von Harras (Directeur ZMF), Hendrik Jan ten Cate (Bestuurder ZLTO) waar ook akkoord is gegeven op de verkenning en de gefaseerde aanpak van het traject. Provincie Zeeland zorgt hierbij voor de bekostiging van een verkenner/projectleider. Er is daarnaast een projectgroep opgericht die met bovenstaande onderzoeksvragen aan de slag gaat. Deze is eind december voor het eerst bij elkaar gekomen. Hierin is Provincie Zeeland ambtelijk (verder: PZ) aanjager en zijn Gemeente Reimerswaal, Min. LNV, Min. I&W, ZLTO, Waterschap en Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) vertegenwoordigd. Vanuit deze werkgroep is een verdere projectstructuur opgezet. Dit plan komt voort uit de afspraken in de werkgroep.
I.2	Doelstelling(en) Het doel van het project is de beschikbaarheid van zoet water in de regio én de waterkwaliteit te verbeteren, en koppelkansen te benutten die bijdragen aan verbetering van de leefomgeving voor mens en dier als ook potentiële economische te benutten kansen die bijdragen aan een duurzame sociaal-maatschappelijke structuur en ontwikkeling van deze regio. In deze fase wordt de haalbaarheid voor een volgende fase getoetst.
I.3	Beoogd(e) Resulta(a)t(en) <u>Fasering volgens projectmanagement</u> Het Kader Grote Projecten en het Handboek Grote Projecten van de provincie Zeeland is als uitgangspunt genomen voor een verdere projectopzet, ook al is er in deze fase nog niet formeel sprake van een project. Volgens de definitie van het handboek grote projecten is de 'initiatieffase' nog niet volledig afgerond. De nut en noodzaak van het (mogelijk) project is

	(bestuurlijk) erkend. Dit heeft geresulteerd in een korte startnotitie, het aanstellen van een verkenner en een werkgroep die verschillende deelonderwerpen verkend. Met dit plan worden de randvoorwaarden en rollen vastgelegd en ter vaststelling voorgelegd voor de overgang naar de volgende fase. Beoogd resultaat: Kern van het plan van aanpak bepalen of het project haalbaar is (en hiermee overgaan naar de zgn. definitiefase volgens het handboek projecten). Daarvoor zijn de volgende processen en onderzoeken nodig: ○ voldoende draagvlak bij agrariërs voor uitvoering van dit project, volgens een nader vast te stellen draagvlakproces; ○ een afgerond haalbaarheidsonderzoek, incl. - en nauwkeurige kostenraming, - uitgebreid met meerdere koppelkansen op het gebied van biodiversiteit mogelijkheden hoe om te gaan met de zoute doelstellingen van verschillende KRW-waterlichamen in het gebied. - Een grond aankoopstrategie ○ Inventarisatie van financieringsmogelijkheden en, bij een go naar de definitie fase van alle verantwoordelijke partijen, nadere bekostigingsafspraken - Bovengenoemde elementen dienen in nauwe samenhang te worden onderzocht t.b.v. de haalbaarheid. Uit (de evaluatie van) andere interprovinciale samenwerkingsprojecten blijkt dat het belangrijk is dat verschillende samenwerkende partijen inzicht hebben in en gevoel hebben bij elkaars belangen voor een wederzijds begrip zodat er ruimte ontstaat om te komen tot een gedragen, integraal plan. Daarbij is van belang dat er vooraf afspraken worden gemaakt die het kader vormen van de samenwerking, op weg naar een gezamenlijk gedragen resultaat. Dit kan door een intentieverklaring vast te stellen tussen partijen met daarin o.a. afspraken over rolverdeling en kosten. Dit is van belang om de haalbaarheid van het project over de bestuursperiode heen te borgen. Het versterkt de mogelijkheid om na bestuurlijke instemming en het haalbaarheidsonderzoek sneller over te gaan naar de uitvoeringsfase en het voorkomt problemen in de toekomst. Dit wordt tevens opgenomen als één van de eindproducten van de verkenning. Tot slot worden er nu als onderdeel van het project reeds quick wins onderzocht: kleine aanpassingen binnen het huidige watersysteem die kunnen leiden tot direct realiseerbare mogelijkheden. De op te leveren producten zijn derhalve uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke GS-nota. Alle deelonderwerpen en producten zijn nader uitgewerkt onder Afbakening (scope).
I.4	Uitgangspunten en randvoorwaarden - Bovengenoemde punten dienen in samenhang onderzocht te worden en zijn onlosmakelijk verbonden. Voortgang op deelonderwerpen heeft invloed op de 'go' 'no-go' van het project/overgang naar de volgende fase. - Het oorspronkelijke onderzoek is verbreed, zoals beschreven onder I.5 Afbakening - Het is wenselijk dat het project tussentijds extra bemensing kan krijgen als het project hier om vraagt. Zie hiertoe ook afbakening/scope.
I.5	Afbakening (scope) Het onderzoek kent een aantal deelonderwerpen. Deze dienen nader te worden onderzocht om de slagingskans te vergroten. De hoofdonderzoeksonderwerpen worden hier nader gespecificeerd. Daarnaast wordt aangegeven wat niet nader is betrokken in het onderzoek naar haalbaarheid. A. Technische haalbaarheid I.

	Het huidige plan is gebaseerd op het rapport van Witteveen en Bos dat een voorkeursvariant schetst. Deze variant kent nog onzekerheden en een grote financiële ramingsrange. De haalbaarheid van het voorkeursscenario (de zgn. Noordelijke route) is nog niet vastgesteld. Dit heeft te maken met een buisleidingenstrook die loopt langs de beoogde Noordelijke route. Sinds het verschijnen van het rapport is er sprake van plannen voor de aanleg van leidingen in de buisleidingenstrook langs de noordelijke route. Het waterschap is kartrekker. De eerste fase van het technisch haalbaarheidsonderzoek wordt op korte termijn uitgezet door het Waterschap (met input van PZ). Bekostiging vindt plaats uit de toe te kennen koplopers 'verkenningsgelden' van de PZ. Product: een tussentijds haalbaarheidsonderzoek van de noordelijke route. <u>B.GBDA</u> Er is een GBDA-werkgroep die uitgangspunten formuleert voor mogelijkheden om GBDA te integreren in het project. De uitgangspunten dienen te worden vastgesteld, zodat deze kunnen worden meegenomen in een volgend specifiek(er) (technisch) onderzoek (zie onder <u>D.Vervolg haalbaarheidsonderzoek</u>). Dan pas komt ook scherper in beeld welke sloten verbreed dienen te worden, waar natuurvriendelijke oevers kunnen worden geplaatst, welke exacte grondbehoefte dit project kent etc. etc. PZ is kartrekker van deze werkgroep m.m.v. alle overige betrokken organisaties. Product: GBDA uitgangspunten <u>C.KRW</u> De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Binnen Zuid-Beveland Oost zijn er drie KRW waterlichamen aangewezen, De waterlichamen Glerum en Waarde zijn watertype M31 (brakke tot zoute wateren, doel >3000 mg Cl/l), het waterlichaam Bath heeft een M30 watertype (zwak brakke wateren, 300-3000 mg Cl/l). Dit conflicteert mogelijk met de beoogde zoetwaterdoerspoeling van het project. Tegelijkertijd bestaat er binnen de werkgroep wel het idee dat de combinatie zoetwateraanvoer, in combinatie met GBDA een kans kan bieden voor de biodiversiteit. Maar dit zal mogelijk ten koste gaan van het bestaande aquatische milieu, waarbij de vraag gesteld moet worden of dit te verantwoorden is. Er wordt derhalve een aparte subwerkgroep KRW opgezet binnen het project die kijkt naar de te verwachten ecologische en juridische effecten van het doorspoelen van de brakke wateren en of (en zo ja hoe) de doelstellingen met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Dit is een werkgroep van PZ, Waterschap en ZMf. Product: ecologische analyse en juridische toets <u>D.Vervolg haalbaarheidsonderzoek</u> Na het eerste technisch haalbaarheidsonderzoek dienen de koppelkansen (GBDA) te worden verwerkt in het ontwerp. Bovendien is bestuurlijk de wens uitgesproken om ook overige koppelkansen te benutten (hemelwateropvang en recreatieve mogelijkheden) Dit leidt tot de volgende (opeenvolgende) stappen voor een vervolg technisch onderzoek: - Korte termijn onderzoeken technische haalbaarheid Noordelijke route en desgewenst specificeren alternatief scenario (zie <u>A. Technische haalbaarheid I.</u>) - Eigendomssituatie en eventuele alternatieven betrekken. - Integreren van de GBDA-wensen in het vervolgontwerp (zie <u>B.GBDA</u>) - MER kader en MER-voortoets - Betrekken KRW-richtlijnen (KRW conflicteert mogelijk met het gewenste uitgangspunt om meer zoet water toe te laten in het gebied, omdat een deel is aangewezen als 'M31'). Hier zal een ecologische analyse en juridisch toets voor nodig zijn. (<u>C.KRW</u>)
--	---

- Hernieuwd/aangescherpt vervolg technisch onderzoek op basis van bovengenoemde punten, waarin nader wordt gespecificeerd:
 - ⌚ GBDA-ontwerp
 - ⌚ grondbehoefte en alternatieven
 - ⌚ overige koppelkansen (integratie hemelwateropvang en mogelijke recreatieve functies)
 - ⌚ Op welke wijze is het project faseerbaar uit te voeren
 - ⌚ optioneel een voortoets op vergunningen
 - ⌚ een concreet bestek
- Een scherper zicht op de grondbehoefte dient integraal te worden betrokken in het draagvlakonderzoek.

Het uitzetten van het vervolgonderzoek zal plaatsvinden door het waterschap, na het doorlopen van voorgaande stappen in de projectgroep. Gesprekken met adviesbureaus leert dat er rekening gehouden moet worden met een doorlooptijd van 9 maanden voor het opleveren van dit product. Ook zal een meervoudige procedure moeten worden doorlopen (procestijd 3 maanden).

Product:

Een uitgebreid ontwerp voorzien van

- GBDA inkleuring
- MER kader en MER-voortoets
- Duiding van benodigde gronden en alternatieven hierbij
- Betrekken koppelkansen recreatie en waterafvoer stedelijk gebied.
- Mogelijkheden voor het opknippen van het project/ de uitvoering.
- Een bestek.

E. Draagvlakproces

Er dient voldoende draagvlak te zijn vanuit agrariërs uit de streek op de plannen. Naast het beoogde positieve effect (zoet water) zijn er ook mogelijke (negatieve) effecten voor agrariërs in de dagelijkse praktijk:

- Verbreding zoetwateraanvoer met GBDA-doelstellingen zal er toe leiden dat (particulier) land langs de daartoe geïnventariseerde waterlopen beschikbaar dient te komen voor het realiseren van de GBDA-doelstelling (zie **B.GBDA**).
- Uitbreiding van het watersysteem leidt tot extra beheer, dat op haar beurt (kan leiden tot meerkosten (retributie) voor agrariërs wat het waterschap in rekening brengt.
- De retributieregeling binnen het waterschap wordt momenteel separaat herzien.

Het is van belang dat er:

- Tussentijds een draagvlakplan wordt vastgesteld;
- Bestuurlijk overeenstemming is over het draagvlakproces (wie worden geconsulteerd en vanuit welk quotum is er sprake van voldoende mate van overeenstemming over doorgang);
- Daadwerkelijk commitment van de agrariërs is volgens de nog af te spreken spelregels.

ZLTO is trekker voor het draagvlakproces en levert een plan op, met deelname van Provincie Zeeland en waterschap). In het vast te stellen plan wordt o.a. opgenomen: definitie van de deelnemers, planning, een quotum, de relatie met de retributieregeling en een aankoopstrategieplan t.a.v. grond (bepalen wat, wanneer, wie en vooral hoe benodigde grond gaat worden geregeld).

Toelichting m.b.t. de rol van grond: grond is noodzakelijk voor de GBDA. Grondverwerving is cruciaal in het verdere project. Het is derhalve van belang een grondstrategie te hebben. Hierbij is het van belang specifiek een aantal zaken in het oog te houden: ruilgronden zijn geen garantie om alle benodigde gronden te verkrijgen. Bestuurlijk dient er te worden uitgesproken of onteigening tot de mogelijkheden behoort (hierbij is er sprake van een doorlooptijd van 3 jaar), het is wenselijk dat overheden waar mogelijk grond ter beschikking stellen t.b.v. dit project)

Product: Een (tussentijds) overeengekomen en daarna doorlopen draagvlakproces, inclusief grond aankoopstrategieplan.

F. Financieringsmogelijkheden

Provincie Zeeland is aanjager van de werkgroep financieringsmogelijkheden. Hiertoe worden de volgende zaken in beeld gebracht:

- Mogelijkheden binnen Provincie, Waterschap en Reimerswaal
- Mogelijkheden Europese subsidies
- Mogelijkheden voor financiering vanuit het Rijk middels koppelkansen.

Naast het in beeld brengen van de mogelijkheden is het van belang dat de volgende financiële vragen worden beantwoord:

- In hoeverre volstaan de in beeld gebrachte middelen? Hoeveel dekking is er hiermee/wat komen we tekort?
- Wat zijn de onzekerheden en risico's bij betreffende geïnventariseerde middelen en hoe gaan we hier mee om (b.v. Hoe wordt er omgegaan met uiteindelijk niet beschikbaar komende (subsidie)gelden?)?
- Op basis van de geïnventariseerde mogelijkheden, tot welke principe-uitspraak over de verdeling van bekostiging komen betrokken partijen?
- Is het project 'opknipbaar' en faseerbaar, en breng dit in beeld voor de financiën, zodat deze ook eenvoudiger gespreid kunnen worden en er met deelonderwerpen kan worden gestart?

PZ is karttrekker voor deze werkgroep m.m.v. Gemeente Reimerswaal en waterschap.

Product: Uitgewerkte financieringsmogelijkheden + spelregels hoe om te gaan met onzekerheden en risico's

G. Intentieovereenkomst

Het is van belang in deze fase ambtelijk te werken aan een intentieverklaring tussen de betrokken partijen. Deze dient parallel aan het proces van het onderzoek naar haalbaarheid voorbereid te worden. Dit is van belang om betrokkenheid van partijen hiermee te borgen. In de intentieovereenkomst:

- erkennen partijen elkaars (soms tegenstrijdige) belangen, maar spreken het vertrouwen uit dat een breed gedragen, integraal plan voor het gebied, de gezamenlijke belangen optimaal kan dienen en versterken;
- wordt de basis gelegd tot het maken van nadere afspraken m.b.t. financiering, uitvoering en samenwerking tussen partijen;
- wordt brede betrokkenheid van partijen uitgesproken en wordt de samenwerking geformaliseerd;
- wordt de projectaanpak (als integraal onderdeel van de intentieovereenkomst) en personele inzet formeel geborgd;
- wordt de voorlopige planning vastgesteld;
- wordt de haalbaarheid om te komen tot uitvoering vergroot.

Nadat de haalbaarheid is vastgesteld is het van belang om nadere afspraken te bekrachtigen in een samenwerkingsovereenkomst, die voortborduurt op de intentieovereenkomst. Hiermee worden rollen en haalbaarheid van het project over de bestuursperiode heen geborgd. Er zijn thans diverse partijen betrokken. In afwachting van de haalbaarheid is er nog geen uitvoerende partij aangewezen in dit stadium. Het is wenselijk aan te sturen op afspraken ten aanzien van een rolverdeling, w.o. de uitvoering, indien het project in een verdere fase komt. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen wat de kerntaken t.a.v. aanleg, onderhoud en

beheer zijn, wie de best geëquipeerde partij voor de uitvoering is en wat uitvoeringscapaciteit is bij de verschillende betrokken instanties. Hierin dient te worden vastgelegd:

- overwegingen
- een rolverdeling tussen partijen en benoemen verantwoordelijkheden per partij (denk aan uitvoering, beheer, grondverwerving, financiën etc)
- verdere projectorganisatie
- hoe om te gaan met de kosten (incl. de financiering hiervan) en onzekerheden/risico's
- Beoogd resultaat en commitment om hieraan conform de rolverdeling aan bij te dragen.
- Planning
- Randvoorwaarden

Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie wordt een intentieovereenkomst vastgesteld. Een nadere samenwerkingsovereenkomst kan aan de hand van de haalbaarheidsresultaten als product worden toegevoegd.

Een werkgroep van waterschap, gemeente en provincie zal een (in deze fase) ambtelijke aanzet maken.

Product: Een vast te stellen intentieovereenkomst tussen PZ, WSS, Gem. Reimerswaal, ZLTO, ZMf

H. Quickwins

Tot slot wordt onderzocht of er quick winst t.b.v. extra zoetwatertoevoer zijn te realiseren, die geïsoleerd uitgevoerd kunnen worden van de rest van het project. Specifiek wordt gedacht aan extra doorspoeling met zoetwater in de Fredericapolder op basis van de overcapaciteit van het waterschapsgemaal aan het Bathse Spuikanaal voor 2 gebieden:

- o de waterloop aan de Bergkilweg, zuidoostelijk van de Vinkenissekreek;
- o de waterloop westelijk van de Vinkenissekreek op de hoek Duivenhoek/Bergkilweg.

Het waterschap neemt hiervoor het initiatief waarbij rekening wordt gehouden met:

- de huidige capaciteit van het gemaal;
- ecologische en hydrologische aspecten;
- het effect op de retributiebijdrage en beheer/onderhoud;
- een mogelijke conflictering met de lange termijn plannen voor de zoetwatermogelijkheden voor Reimerswaal.

Dit wordt primair gedaan door het waterschap. Wel worden ideeën getoetst aan de projectgroep om te voorkomen dat er onomkeerbare beslissingen worden genomen die conflicteren met het grote project zoetwatervoorziening Reimerswaal. Er dienen nog financiële afspraken over de quick wins te worden gemaakt.

Product: een uitwerking van de quick win mogelijkheden.

Besluitvorming:

Het is van belang dat bovengenoemde producten in één of meerdere besluitvormingsnota's binnen de betrokken organisatie (Gem. Reimerswaal, PZ, waterschap) worden ingebracht om project al dan niet naar uitvoeringsfase te brengen. Op alle deelonderwerpen moeten cruciale beslispunten worden uitgewerkt t.b.v. bestuurlijke besluitvorming.

Beperkingen/afbakening

Het gebied waar de nieuwe zoetwaterdoorvoer betrekking op heeft is geografisch beperkt. Het loopt van het Bathse Spuikanaal (oostelijk) tot aan het kanaal van Zuid-Beveland (westelijk). De Yerseke Moer, het gebied (noord)oostelijk van de Bathsedijk en de Reigenbergsche polder (reeds voorzien van Zoet water) zijn echter uitgezonderd van de

	plannen. Exacte afbakening wordt bekrachtigd in de bestuurlijk te sluiten intentieovereenkomst. In deze fase zijn (omgevings)vergunningen nog geen onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn een aantal onzekerheden die betrekking hebben op: - Natura 2000 en stikstof ¹ Een passende beoordeling moet zekerheid geven dat het project de natuurlijke kenmerken van het nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet zal aantasten. Wetgeving is thans aan verandering onderhevig. Tegelijkertijd kan het project (door de GBDA) mogelijk bijdragen aan het behalen van stikstofdoelen. Een beoordeling op de gevolgen van dit project voor beschermde natuurwaarden en stikstof kan in totaal 52 weken duren (26 weken voor voorbereiding voortoets en passende beoordeling, 26 weken voor een passende beoordeling, incl. zienswijze). - MER procedure ² richting de uitvoering is nog niet uit te sluiten dat er sprake kan zijn van een MER(bedoelings)plicht. Er moet nog worden afgepeeld of er een plan of programma moet worden vastgesteld en wie hiervoor bevoegd gezag is. Daarnaast kan een MER(bedoordeling) onderdeel uitmaken van de verdere vergunningprocedure. Op basis van een eerste toets is de verwachting dat er in ieder geval een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit benodigd is. Een MER-voortoets/kadering wordt nu geïntegreerd in de uitvraag voor het tweede technische haalbaarheidsonderzoek. - Projectbesluit ³ Wanneer grofweg in beeld is gebracht welke vergunningen er benodigd zijn voor de realisatie van het project kan een inschatting worden gemaakt over de bevoegdheden verdeling. Bij complexe projecten met een publiek belang kan het instrument 'projectbesluit' door waterschap en Provincies mogelijk ook worden ingezet. Er moet op een later moment nog worden beoordeeld of dit passend is voor dit project. - Natuurnetwerk Zeeland. Het doel van het natuurnetwerk is behoud en versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. Het is van belang dat de plannen in overeenstemming zijn met de omgevingsverordening rondom het Natuurnetwerk Zeeland. Voor het vervolg zijn 2 punten van belang: - Het nader bepalen van de scope van het project door het uitwerken van het (technisch) ontwerp, incl. koppelkansen zodat het effect op (milieu)wetgeving scherper kan worden bepaald. - Het bepalen van de rolverdeling en potentiële uitvoerder van het project. Vaststelling hiervan heeft mede invloed op wie wordt aangemerkt als bevoegd gezag voor de beoordeling. Wie wordt projectuitvoerder en hoe worden vergunningen aangevraagd. Er is een schil aan 'meelezers' bij het project, zodat we tijdig (tussentijds) kunnen schakelen om o.a. het vergunningsprocessen in gang te zetten. Daarom is ervoor gekozen om nu meerdere disciplines als meelezer te betrekken bij het project. De agendaleden kunnen (ongevraagd) adviseren, zodat het project sneller kan worden opgeschaald. Zie II.1 projectorganisatie.
I.6	Relatie met andere projecten De zoetwatervraag van agrariërs binnen Zeeland is niet beperkt tot Reimerswaal. Ook andere gebieden in Zeeland worden getroffen door toenemende droogteproblematiek als gevolg van klimaatverandering. Provincie Zeeland onderzoekt momenteel in de breedte mogelijkheden tot zoetwatervoorziening voor Zeeland. Ministeries LNV en I&W hebben vragen gesteld over de effecten van zoetwateronttrekking t.b.v. het project Zoetwatervoorziening Reimerswaal. Dit mede vanuit het oogpunt dat het Rijk mogelijk een rol kan spelen in de medebekostiging van dit project, mits het project zo wordt vormgegeven dat er meerdere (Rijks)doelstelling kunnen worden bereikt. Er wordt t.b.v. het Ministerie in beeld gebracht wat de zoetwatervraag is die samenhangt met deze maatregel, in verhouding tot de zoetwatervragen van andere functies en

	omliggende gebieden. Ook wordt in beeld gebracht wat het ecologische effect is van uitvoering van de maatregel op de (afnemende)zoetwatertoevoer naar de Westerschelde. Zoetwaterbehoefte voor andere projecten die uit dezelfde 'bron' tappen kunnen effect hebben op de kansrijkheid van dit project. Wederzijds elkaar informeren over andere zoetwaterontwikkelingen is dus van belang voor de kans van slagen van dit project. Hiervoor zal contact worden gelegd met Rijkswaterstaat, waterbeheerder van het Volkerak-Zoommeer.
--	---

II. PROJECTOPZET

II.1	Projectorganisatie PZ is aanjager en levert de projectleiding. Gemeente Reimerswaal, Min. LVVN, Min. I&W, ZLTO, waterschap en ZMf zijn vertegenwoordigd in een brede projectgroep. De deelnemers, inclusief toegevoegde inzet, zijn in het schema in bijlage 1. weergegeven. Uit deze werkgroep zijn deelnemers in verschillende groepen georganiseerd om de bovengenoemde deelonderwerpen te onderzoeken. Er zijn zeven (werk)groepen: - Financiën (kartrekker PZ, m.m.v. waterschap en Gem. Reimerswaal) - (technische) haalbaarheid 1^e fase (kartrekker WSS) - Draagvlak (kartrekker ZLTO, WSS t.a.v. retributiekosten, m.m.v. PZ) - GBDA (kartrekker PZ, m.m.v. alle partijen) - KRW (coproductie PZ, WS, ZMf) - Quick wins (waterschap, m.m.v. PZ) - Intentieverklaring (PZ, WSS, Gem. Reimerswaal) Elke werkgroep levert een plan van aanpak en subproducten op die in de overall werkgroep worden besproken. Doelen: - Vaststelling en beschouwen van integraliteit van de plannen; - Intern draagvlak binnen eigen organisatie verkrijgen; - Haalbaarheid toetsen. De volgende personen PZ zijn agenda-lid:  De projectleider rapporteert aan de manager van het Programmabureau uitvoering Provincie Zeeland. Portefeuillehouder binnen PZ is Arno Vael. Hij wordt door de projectleider, samen met managers Klimaat & Energie en waar nodig de manager Landelijk Gebied, Landbouw & Natuur, periodiek geïnformeerd. Het bestuur waar de plannen tussen organisatie wordt vastgesteld bestaat uit: Arno Vael (gedeputeerde Provincie Zeeland), Wim van Gorsel (bestuurder Waterschap Scheldestromen), Martien van Overloop (wethouder gemeente Reimerswaal), Ira von Harras (Directeur ZMF), Hendrik Jan ten Cate (bestuurder ZLTO).
II.2	Opzet/fasen Doel is eind januari 2026 een 'go-no go' moment te hebben. Zie hiertoe III.6. Tijd.
II.3	Risico's Specifieke risico's:  <u>Draagvlak</u>

	Er is nauwe samenhang tussen het draagvlak en (1.) nader te bepalen grondbehoefte op basis van het ontwerp en (2.) de (nog te herziene) retributie-effecten voor de eindgebruiker. ■ <u>Beperkingen GBDA i.r.t. KRW:</u> De mate waarin GBDA verenigbaar is met KRW-doelstellingen wordt onderzocht. ■ <u>Vergunbaarheid</u> ■ <u>Rolverdeling:</u> Er dient overeenstemming te zijn over de rolverdeling tussen partijen om tot een volgende fase over te kunnen gaan. ■ <u>Capaciteit:</u> Er kan op basis van tussentijdse inzichten extra capaciteit nodig zijn. Het is van belang dat partijen kunnen opschalen. ■ <u>Beschikbaarheid benodigde grond</u> i.r.t. ntb grondstrategie ■ <u>Financiering:</u> indien onvoldoende financiële middelen worden gevonden, kan dat betekenen dat het project onuitvoerbaar wordt op basis van geld. Vertraging van deelonderwerpen heeft bovendien effect op andere deelonderwerpen.
II.4	Communicatie De communicatieadviseur van Gedeputeerde Vael wordt periodiek bijgepraat. Waar nodig vindt overleg plaats met communicatieadviseurs van overige betrokken partijen.

III. BEHEERSASPECTEN

III.1	Geld Het project bevindt zich nu in een verkenningsfase. Er zijn in deze fase specifiek middelen nodig voor het doen van een vervolgonderzoek en mogelijk t.b.v. het draagvlak proces. Deze worden naar verwachting voldoende gedekt uit het geld van de koplopersmaatregelen (€ 250.000,-). Het project zelf heeft in deze (verkenning)fase geen andere middelen. Wel wordt expliciet ingezet op de koppeling met andere initiatieven in het gebied en mogelijke quick wins. Waar mogelijk kan dit kansen bieden voor directe investeringen die het project ten goede komen. Hiertoe kan PZ dan bijdragen met middelen uit koplopersmaatregelen of andere restmiddelen. Ook kan er een beroep worden gedaan op andere betrokken organisaties als zich kansen voor doen.
III.2	Organisatie Er is nu nog sprake van een verkenningsfase. Er is in deze fase nog geen projectbeheerser aangesteld. Bewaking vindt plaats op basis van de vastgestelde projectstructuur en binnen de periodiek vastgelegde overleggen.
III.3	Risico's Risico's zijn beschreven in II.3 en maken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden binnen de projectopzet.
III.4	Kwaliteit Kwaliteitsbewaking vindt in deze fase m.n. plaats door periodieke voortgang te toetsen in de verschillen overlegvormen.
III.5	Informatie - De governance is beschreven in II.1. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt. De vaste projectgroep wordt ondersteund door een (w.n.) projectondersteuner van de provincie Zeeland. - Communicatie is in deze fase incidenteel betrokken, maar inzet kan worden opgeschaald. - De opslag en registratie van gegevens vindt plaats op de P-schijf en formele stukken in het Zaaksysteem (beiden PZ). Hiervoor is een zaak aangemaakt. Met externe partijen zal worden overlegd of volledige administratie in de

		Teamsomgeving kan worden omgezet, nadat kinderziektes t.a.v. Teams zijn doorlopen.
III.6	Tijd	Beoogde afronding haalbaarheidsonderzoek eind februari 2026 tbv 'go' – 'no-go' moment in opmaat naar volgende projectfase (uitvoering). Samenvattend dienen de volgende producten te worden opgeleverd in één of meer besluitvormingsnota's: - GBDA uitgangspunten; - KRW: ecologische analyse en juridische toets - Een uitgebreid ontwerp voorzien van - o GBDA inkleuring - o Duiding van benodigde gronden en alternatieven hierbij - o Betrekken koppelkansen recreatie en waterafvoer stedelijk gebied. - o Mogelijkheden voor het opknippen van het project/ de uitvoering en aanbevelingen hierbij. - o Voortoets MER/kader - o Een bestek. - Uitgewerkte financieringsmogelijkheden + spelregels hoe om te gaan met onzekerheden en risico's - Een vast te stellen intentieverklaring tussen PZ, WSS, Gem. Reimerswaal, ZLTO - Een (tussentijds) overeengekomen en daarna doorlopen draagvlakproces. - Grond aankoopstrategieplan - Uitwerking van de quick win mogelijkheden. Een nadere planning is in excel bijgevoegd. Deze planning is gemaakt o.a. op basis van de beschikbaarheid van de diverse leden van de werkgroep. Het minder of niet beschikbaar zijn, van werkgroep leden zal direct effect hebben op de planning,

Bijlage 1. Deelnemers project

Naam	Rol/competentie	organisatie	Omvang	(Deel)werkgroep
[REDACTED]	[REDACTED]	PZ	16 u.p.w.	Algemeen, financiën, KRW, quick wins
[REDACTED]	[REDACTED]	PZ	2 upw	Algemeen, haalbaarheidsonderzoeken W+B
[REDACTED]	[REDACTED]	PZ	1 upw	Algemeen, haalbaarheidsonderzoek W+B
[REDACTED]	[REDACTED]	PZ	4 upw	Algemeen, GBDA
[REDACTED]	[REDACTED]	PZ	16 upw	Algemeen, financiën, uitvoerbaarheid, quick wins
[REDACTED]	[REDACTED]	PZ	2 upw	Algemeen
[REDACTED]	[REDACTED]	PZ	2 upw	KRW
[REDACTED]	[REDACTED]	Gem. Reimerswaal	2 upw	Algemeen, financiën, GBDA
[REDACTED]	[REDACTED]	ZLTO	2 upw	Algemeen + stakeholdermanagement
[REDACTED]	[REDACTED]	Waterschap	4 upw	Algemeen , GBDA, haalbaarheidsonderzoek W+B, intentieverklaring, quick wins
[REDACTED]	[REDACTED]	Waterschap	2 upw	Quick wins, technische haalbaarheid
[REDACTED]	[REDACTED]	Waterschap	2 upw	Quick wins, technische haalbaarheid
[REDACTED]	[REDACTED]	Waterschap	6 upw	Algemeen , GBDA, haalbaarheidsonderzoek W+B, intentieverklaring
[REDACTED]	[REDACTED]	Waterschap	2 upw	KRW
[REDACTED]	[REDACTED]	ZMf	2 upw	Algemeen, GBDA, KRW
[REDACTED]	[REDACTED]	Min LVVN	nvt	Algemeen
[REDACTED]	[REDACTED]	Min I&W	nvt	Algemeen

Bijlage 2. Vragen Rijk n.a.v. de koplopersmaatregelen

Reactie van het Rijk aan Provincie Zeeland 20 december 2024 n.a.v. verzoek om 'Extra middelen voor uitvoering maatregelpakketten in uw provincie'

Resumerend constateert het Rijkstoetsteam dat er op dit moment geen grond is voor een positief oordeel voor uitvoering van de door de provincie voorgestelde investeringen. Tegelijk kan het onderdeel groenblauwe dooradering kansrijk zijn voor versterking van natuur en verbetering van de waterkwaliteit in het gebied. Met het door de provincie voorgestelde onderzoek kan dit verder verkend worden. In het overleg op 17 oktober 2024 heeft het Rijkstoetsteam met de provincie Zeeland afgesproken dat bij dit onderzoek de volgende aspecten betrokken worden:

- *Zoetwatervraag die samenhangt met de maatregel in verhouding tot de zoetwatervragen van andere functies en omliggende gebieden.*
- *Volhoudbaarheid van de landbouw in relatie tot bestaande en naar de toekomst toe verwachte toename van verzilting.*
- *Effect van uitvoering van de maatregel op de (afnemende) zoetwatertoevoer naar de Westerschelde.*
- *Welke GBDA interventies met de maatregel worden ingezet.*
- *Welke gronden aangekocht dienen te worden.*
- *Onderbouwde bijdrage van de maatregel aan de doelen, in het bijzonder natuurversterking (VHR, GBDA) en waterkwaliteit.*
- *Kosten voor inrichting en beheer van de groenblauwe dooradering.*

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Activiteiten/Taken
technische haalbaarheid 1
GBDA uitgangspunten
KRW
draagvlakproces, incl grond aankoopstrategie plan
aangepaste (technische) haalbaarheid (2)
financien
onderzoeken quick wins
intentieverklaring
Bestuurlijk overleg
concept PVA
GBDA
technische haalbaarheid 1
KRW
financien
vaststelling aangepaste haalbaarheid, financien, quick wins, MER, draagvlak,
intentieovereenkomst
GS/BW/DB nota's
